

白アリ防除工事報告書



お客様名： 高岡市宮田町既存住宅

所在地： 高岡市宮田町8-22

工事日： 2024 年 6 月 19 日



バイオゾーン メディカル 株式会社

本社 富山市南央町3番37 TEL 076-429-0303

1. 防除施工について

↑ 対象とするしろありの種類

本工事の対象とするしろありの種類は、ヤマトシロアリとする。

↑ 薬剤・工法

使用する薬剤・工法などは、（公社）日本しろあり対策協会で認定登録されたものとする。



↑ 処理方法

穿孔注入処理法は、木材に9mmのドリルで木材の2/3以上の深さに穿孔し薬剤を注入する方法です。

木部処理法は、吹き付け処理法、塗布処理法があり、処理は前記の処理の一つ又はそれらの組み合わせによって行う。

木部処理は、木材を薬剤で処理して防蟻および防腐の効果を持たせる処理する方法です。原則として一階部分に使用されている木材を対象とする。ただし二階以上であっても被害がある箇所に対しては必要な処理を行う。

土壌処理法は帯状散布法、面状散布法の処理の一つ又は、それらの組み合わせによって行う。

帯状散布法は、床下土壌表面に液状の土壌処理剤を帯状に散布する方法で、基礎の内側及び束石の周囲、配管の立ち上がり部分の土壌に対して壁際から20cm幅で薬剤を処理する

面状散布法は、床下土壌表面に液状の薬剤を全面に散布する。

穿孔吹付処理法は、モルタル仕上げなどの大壁造の壁体に5mmのドリルで穿孔しノズルを挿入して壁体内部の木部に吹付けをする方法です。

↑ 効果

処理を行った建築物は、しろありに対してその処理をした建築物全体に効果があり防腐に対しては処理をした木材について効果があるものとする。

2. 防除完了報告書

No.

2024年6月19日

報告先 有限会社 ランド・プラン 様

〒939-8232 富山市南央町3番37
バイオゾーン メディカル 株式会社

いつもお世話になり、有難うございます。
下記の通り施工完了致しましたので、
ご報告申し上げます。

TEL (076) 429-0303

FAX (076) 429-3303

注文書No.		受付	有限会社 ランド・プラン		
施主名		所在地			
高岡市宮田町既存住宅 様		高岡市宮田町8-22			
建築区分	木造		施工区分	白蟻防除工事	
建築面積	52.8 m ²		施工完了日	2024年6月19日	
建物	一戸建て				
使用薬剤	部位	薬剤名		使用量	
	木部	タケロック20DC		0.3	ℓ/m ²
	土壌	タケロックMC50スーパー		3	ℓ/m ²
施工内容	<input checked="" type="checkbox"/> 穿孔処理	蟻害部及び蟻害の危険がある箇所の穿孔処理			
	<input checked="" type="checkbox"/> 木部処理	穿孔箇所薬剤注入及び吹付処理			
	<input checked="" type="checkbox"/> 土壌処理	床下土壌表面散布処理			
	<input type="checkbox"/> 壁体内処理				
	<input checked="" type="checkbox"/> その他	玄関土台注入処理			
	<input type="checkbox"/> 別紙仕様書の通り				
保証期間	2029年6月18日	管理期間	2029年6月18日	確認印	施工担当者
連絡事項	工事完了後、2年目・5年経過前に床下診断を実施する。				

保証書を作成する都合がありますので、施主名・所在地等間違いがありましたら、至急ご連絡下さいます様お願い致します。

3. 1階 平面図



蟻道



蟻害



床下進入口



通風口

4-1. 工事写真 (添付画像1)

床下進入口



養生

室内を汚さないように、養生を行いました。

床下



木部処理剤 注入処理

前回、穴を開けた箇所に薬剤の注入処理を行いました。

床下



木部処理剤 吹付け処理

木部に対して防腐・防蟻薬剤を散布し、木材の表面を保護しました。

床下



土壌処理剤 帯状散布処理

基礎廻り、束廻り、配管廻りに沿って帯状に土壌処理剤を散布しました。散布することにより木材に白アリが侵入するのを防ぎます。

4-2. 工事写真 (添付画像2)

床下



土壌処理剤 面状散布処理

土壌表面に土壌処理剤を散布しました。散布することにより薬剤成分でバリアーを張り、地中から白アリの侵入を防ぎます。

7

玄関



土台 注入処理

土台に4mm程度の穴を開け、薬剤の注入処理を行いました。

8


5. 今後の流れ

↑ 床下定期診断とは・・・

バイオゾーン メディカル 株式会社では、白アリ防除(駆除工事や新築時の予防工事など)を行った建物に対して、経過を確認する為の床下定期診断を行っております。大切な建物に白アリの発生・再発の有無を調べるために床下に入り、床組木材や土壌・基礎の状態や配管の異常をチェックするもので**1時間程度**で終わる**無料**の点検になっていきます。

↑ 定期診断のご案内

定期診断の時期が来たら、往復ハガキにてお客様のお宅へご案内させていただきます。

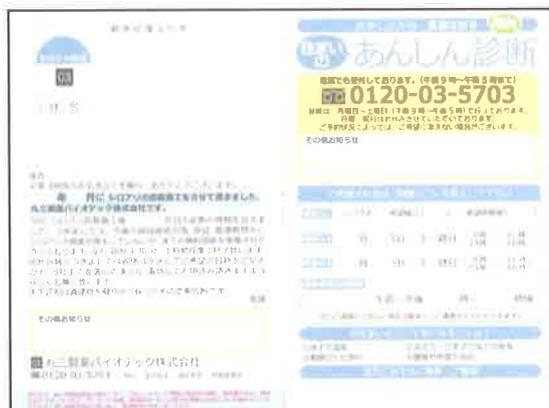

返信用ハガキにご希望の日時、お家のことで気になることなどを記入の上、返信してください。

※基本的に上記のような往復ハガキになりますが、対象年度によってデザインが異なります。

↑ 当社からお電話での確認

返信ハガキが当社に届きましたら、当社の担当の者より確認のお電話をさせていただきます。

↑ 床下無料診断の実施

決めさせていただいた日時にお伺いし、床下の定期診断を行います。

床下の現状をご説明させていただきます。疑問、質問等ございましたらお気軽にお尋ねください。

↑ 床下無料診断スケジュール

2年目・5年経過前
